Name	Work
Prise en main	5d
Compilateur Hello world	**15d**
Lexeur	5d
Parser	10d
Compilateur sans objet	**64d**
A : code	4d
A : tests	8d
B : code	9d
B : tests	18d
C : code	**9d**
GenCode Simple Op Arithm	3d
GenCode with variables	3d
GenCode with control struct	3d
C : tests	16d
Compilateur essentiel	**40d**
A : code	**2d**
Syntaxe without methods	1d
Syntaxe with methods	1d
A : tests	4d
B : code	**6d**
Context without methods	3d
Context with methods	3d
B : tests	10d
C : code	**6d**
CodeGen without methods	3d
CodeGen with methods	3d
C : tests	12d
Extension	**54d**
Analyse/négociation	8d
A : tests	4d
A : code	4d
B : code	10d
B : tests	10d
C : code	9d
C : tests	9d
Documentations	**28d 4h**
Manuel utilisateur	6d
Bilan	3d 4h
Documentation extension	10d
Documentation de conception	3d
Documentation de validation	6d

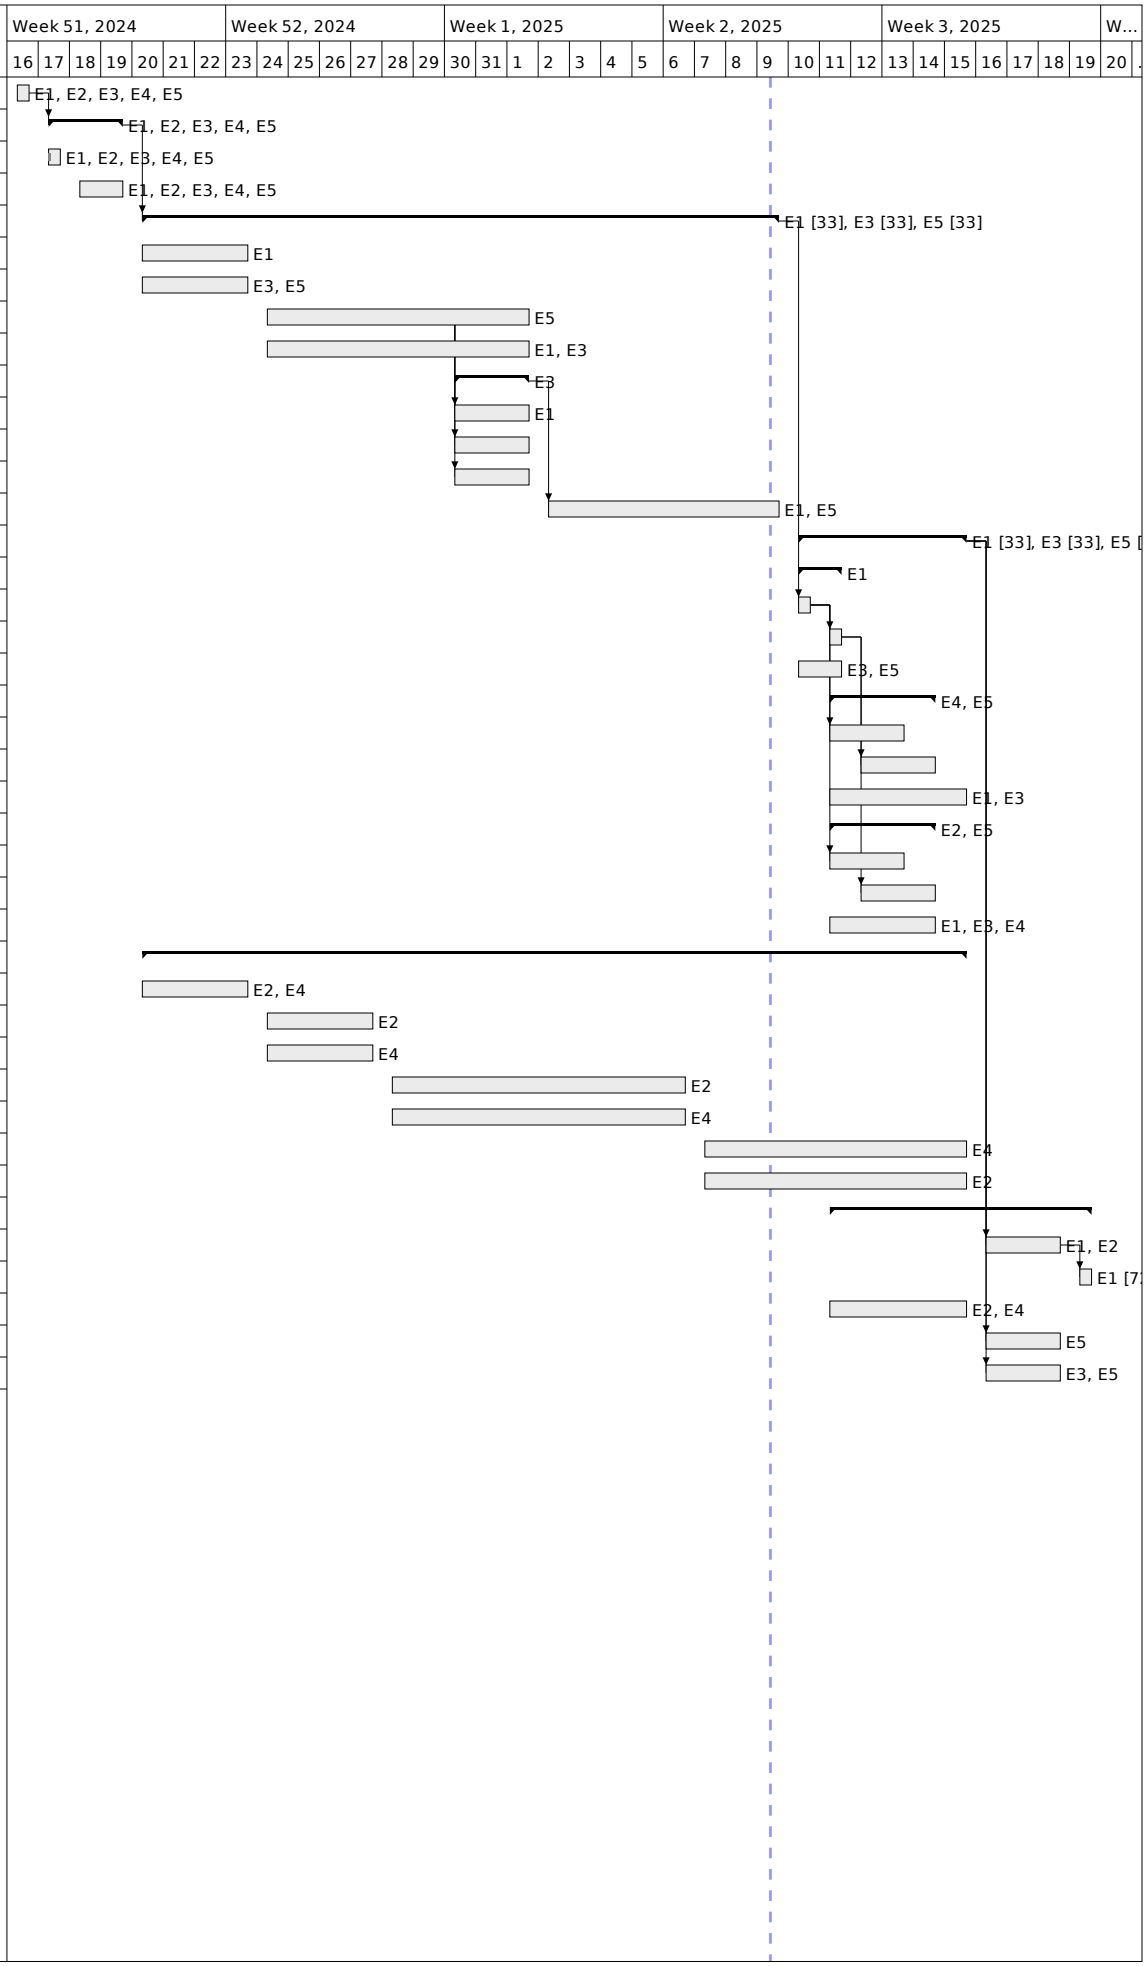

WBS	Name	Start	Finish	Work	Duration	Slack	Cost	Assigned to	% Complete
1	Prise en main	Dec 16	Dec 16	5d	1d	4d	0	E1, E4, E3, E2, E5	0
2	**Compilateur Hello world**	**Dec 17**	**Dec 19**	**15d**	**3d**	**3d**	**0**	E1, E4, E3, E2, E5	0
2.1	Lexeur	Dec 17	Dec 17	5d	1d	5d	0	E1, E4, E3, E2, E5	20
2.2	Parser	Dec 18	Dec 19	10d	2d	3d	0	E1, E4, E3, E2, E5	0
3	**Compilateur sans objet**	**Dec 20**	**Jan 9**	**64d**	**21d**	**1d**	**0**	E1, E3, E5	0
3.1	A : code	Dec 20	Dec 23	4d	4d	18d	0	E1	0
3.2	A : tests	Dec 20	Dec 23	8d	4d	18d	0	E3, E5	0
3.3	B : code	Dec 24	Jan 1	9d	9d		0	E5	0
3.4	B : tests	Dec 24	Jan 1	18d	9d	9d	0	E1, E3	0
3.5	**C : code**	**Dec 30**	**Jan 1**	**9d**	**3d**	**1d**	**0**	E3	0
3.5.1	GenCode Simple Op Arithm	Dec 30	Jan 1	3d	3d	1d	0	E1	0
3.5.2	GenCode with variables	Dec 30	Jan 1	3d	3d	1d	0		0
3.5.3	GenCode with control struct	Dec 30	Jan 1	3d	3d	1d	0		0
3.6	C : tests	Jan 2	Jan 9	16d	8d	1d	0	E1, E5	0
4	**Compilateur essentiel**	**Jan 10**	**Jan 15**	**40d**	**6d**		**0**	E1, E3, E5	0
4.1	**A : code**	**Jan 10**	**Jan 11**	**2d**	**2d**	**4d**	**0**	E1	0
4.1.1	Syntaxe without methods	Jan 10	Jan 10	1d	1d	1d	0		0
4.1.2	Syntaxe with methods	Jan 11	Jan 11	1d	1d	1d	0		0
4.2	A : tests	Jan 10	Jan 11	4d	2d	4d	0	E3, E5	0
4.3	**B : code**	**Jan 11**	**Jan 14**	**6d**	**4d**	**1d**	**0**	E4, E5	0
4.3.1	Context without methods	Jan 11	Jan 13	3d	3d	2d	0		0
4.3.2	Context with methods	Jan 12	Jan 14	3d	3d	1d	0		0
4.4	B : tests	Jan 11	Jan 15	10d	5d		0	E1, E3	0
4.5	**C : code**	**Jan 11**	**Jan 14**	**6d**	**4d**	**1d**	**0**	E2, E5	0
4.5.1	CodeGen without methods	Jan 11	Jan 13	3d	3d	2d	0		0
4.5.2	CodeGen with methods	Jan 12	Jan 14	3d	3d	1d	0		0
4.6	C : tests	Jan 11	Jan 14	12d	4d	1d	0	E1, E4, E3	0
5	**Extension**	**Dec 20**	**Jan 15**	**54d**	**27d**	**4d**	**0**		0
5.1	Analyse/négociation	Dec 20	Dec 23	8d	4d	27d	0	E4, E2	0
5.2	A : tests	Dec 24	Dec 27	4d	4d	23d	0	E2	0
5.3	A : code	Dec 24	Dec 27	4d	4d	23d	0	E4	0
5.4	B : code	Dec 28	Jan 6	10d	10d	13d	0	E2	0
5.5	B : tests	Dec 28	Jan 6	10d	10d	13d	0	E4	0
5.6	C : code	Jan 7	Jan 15	9d	9d	4d	0	E4	0
5.7	C : tests	Jan 7	Jan 15	9d	9d	4d	0	E2	0
6	**Documentations**	**Jan 11**	**Jan 19**	**28d 4h**	**9d**		**0**		0
6.1	Manuel utilisateur	Jan 16	Jan 18	6d	3d		0	E1, E2	0
6.2	Bilan	Jan 19	Jan 19	3d 4h	1d		0	E1, E4, E3, E2, E5	0
6.3	Documentation extension	Jan 11	Jan 15	10d	5d	4d	0	E4, E2	0
6.4	Documentation de conception	Jan 16	Jan 18	3d	3d	1d	0	E5	0
6.5	Documentation de validation	Jan 16	Jan 18	6d	3d	1d	0	E3, E5	0

Name	Short name	Type	Group	Email	Cost
Benjamin	E1	Work		benjamin.sullet@grenoble-inp.org	0
Samy	E2	Work		samy.zouggari@grenoble-inp.org	0
Mathis	E3	Work		mathis.hurstel@grenoble-inp.org	0
Lucas	E4	Work		lucas.zivkovic@grenoble-inp.org	0
Victor	E5	Work		fie-victor.traore@grenoble-inp.org	0
